

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport December 2025

Faurbo Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	1970,49 m ³
Boring 1	946,79 m ³
Boring 2	1023,70 m ³
TOTAL UDPUMPNING	1929,30 m ³
Udpumpning	1929,30 m ³
ANDET	5,49 m ³
Skyllevand	5,49 m ³

KWH FORBRUG




UDPUMPNING	801 kWh
Pumpe 1	392 kWh
Pumpe 2	409 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

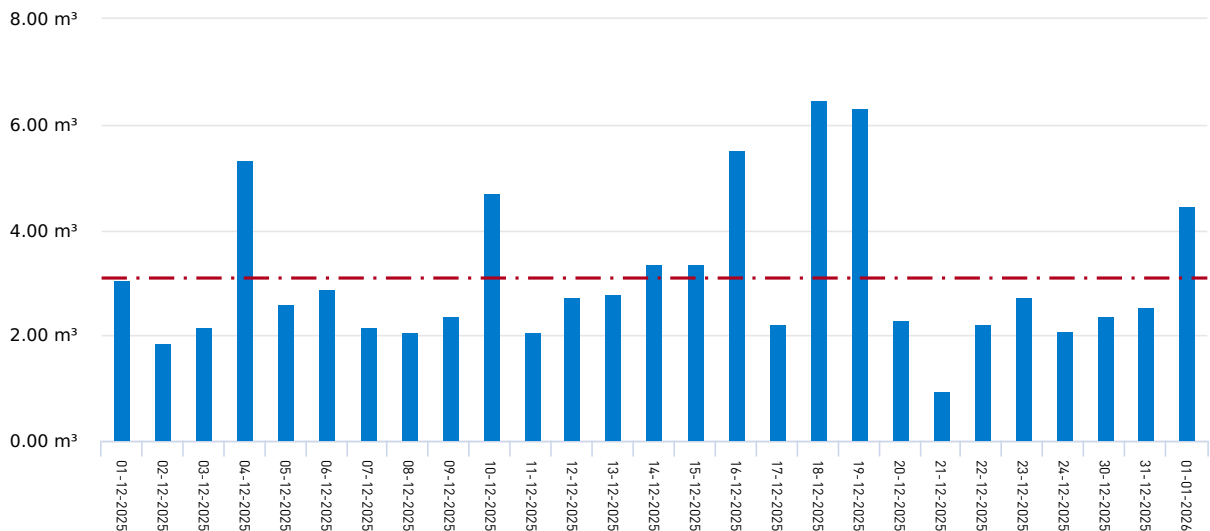

FILTRE

FILTERSKYL	16
Filter 1	4
Filter 2	4
Filter 3	4
Filter 4	4

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,35 m ³
	24-12-25 05:00->06:00
Maximum	306,46 m ³
	29-12-25 11:00->12:00
Gennemsnit	3,07 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	2,41 m ³ /kWh
-------------	--------------------------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport December 2025

Faurbo Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING




● Boring 1	5d 03t 27m
● Boring 2	5d 13t 37m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	15d 10t 49m
● Pumpe 2	16d 06t 52m

ANDET

● Beluftning	10d 17t 21m
● Skylleluft	00t 32m



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 1	-49,39 m	-53,52 m	4,13 m
Boring 2	-49,30 m	-53,35 m	4,05 m



TÆLLERSTAND

31-12-2025 23:59:59

Boring 1	102608 m³
Boring 2	94899 m³
Udpumpning	117523 m³
Skyllevand	197567 m³



Blue Control®
BC7000
